



RÉHABILITATION du GYMNASSE F. LUSSON

Les travaux prennent fin !

Nous arrivons au terme de ces travaux de grande envergure.

Avec près de 2,9 Millions investis au profit de la pratique sportive et deux années de projet ; la période estivale est productive et les travaux s'accroissent pour permettre aux sections qui occupent le bâtiment, de pouvoir se réinstaller pour courant septembre.

A l'extérieur du bâtiment, la pergola devrait prendre bientôt sa place et la rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite est en cours. Toutes deux seront finalisées d'ici la fin août.

À l'intérieur du bâtiment, toutes les cloisons sont posées et la fibre est installée. Il reste la pose du carrelage dans les vestiaires, les sanitaires et le couloir. Les portes de placard seront installées dans la foulée et les étagères/armoires, quant à elles, seront posées par nos services techniques cet été.

Si les peintures sont achevées dans toutes les salles côté multisports, ce n'est pas encore le cas pour la partie basket où il reste toutes les peintures y compris celles des gradins, la pose des sièges et finaliser les bureaux. De même, les équipements sportifs tels que les paniers de basket seront installés à la rentrée de septembre.



Les prochaines

grandes étapes

(calendrier prévisionnel non contractuel)

- Réception du chantier début août.
- Passage de la **commission de sécurité** SDIS (pompiers) le 6 septembre.
- Levée des réserves éventuelles, courant septembre pour l'**ouverture au public** et **installation des sections**
- **Plantation des arbres** à l'automne

RETOUR EN IMAGES ...

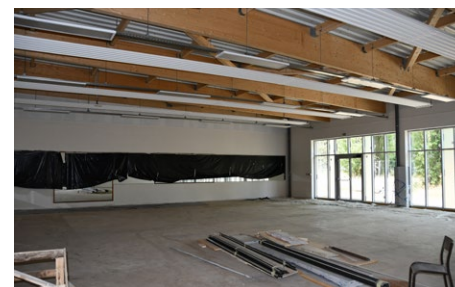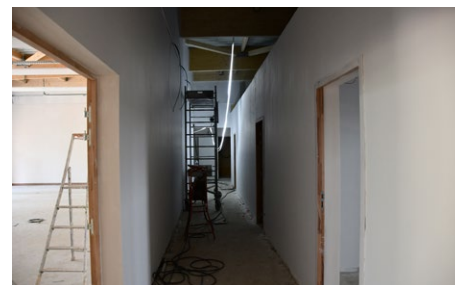

Retrouvez le chantier en images [ici](https://www.arnage.fr) sur [arnage.fr](https://www.arnage.fr)
